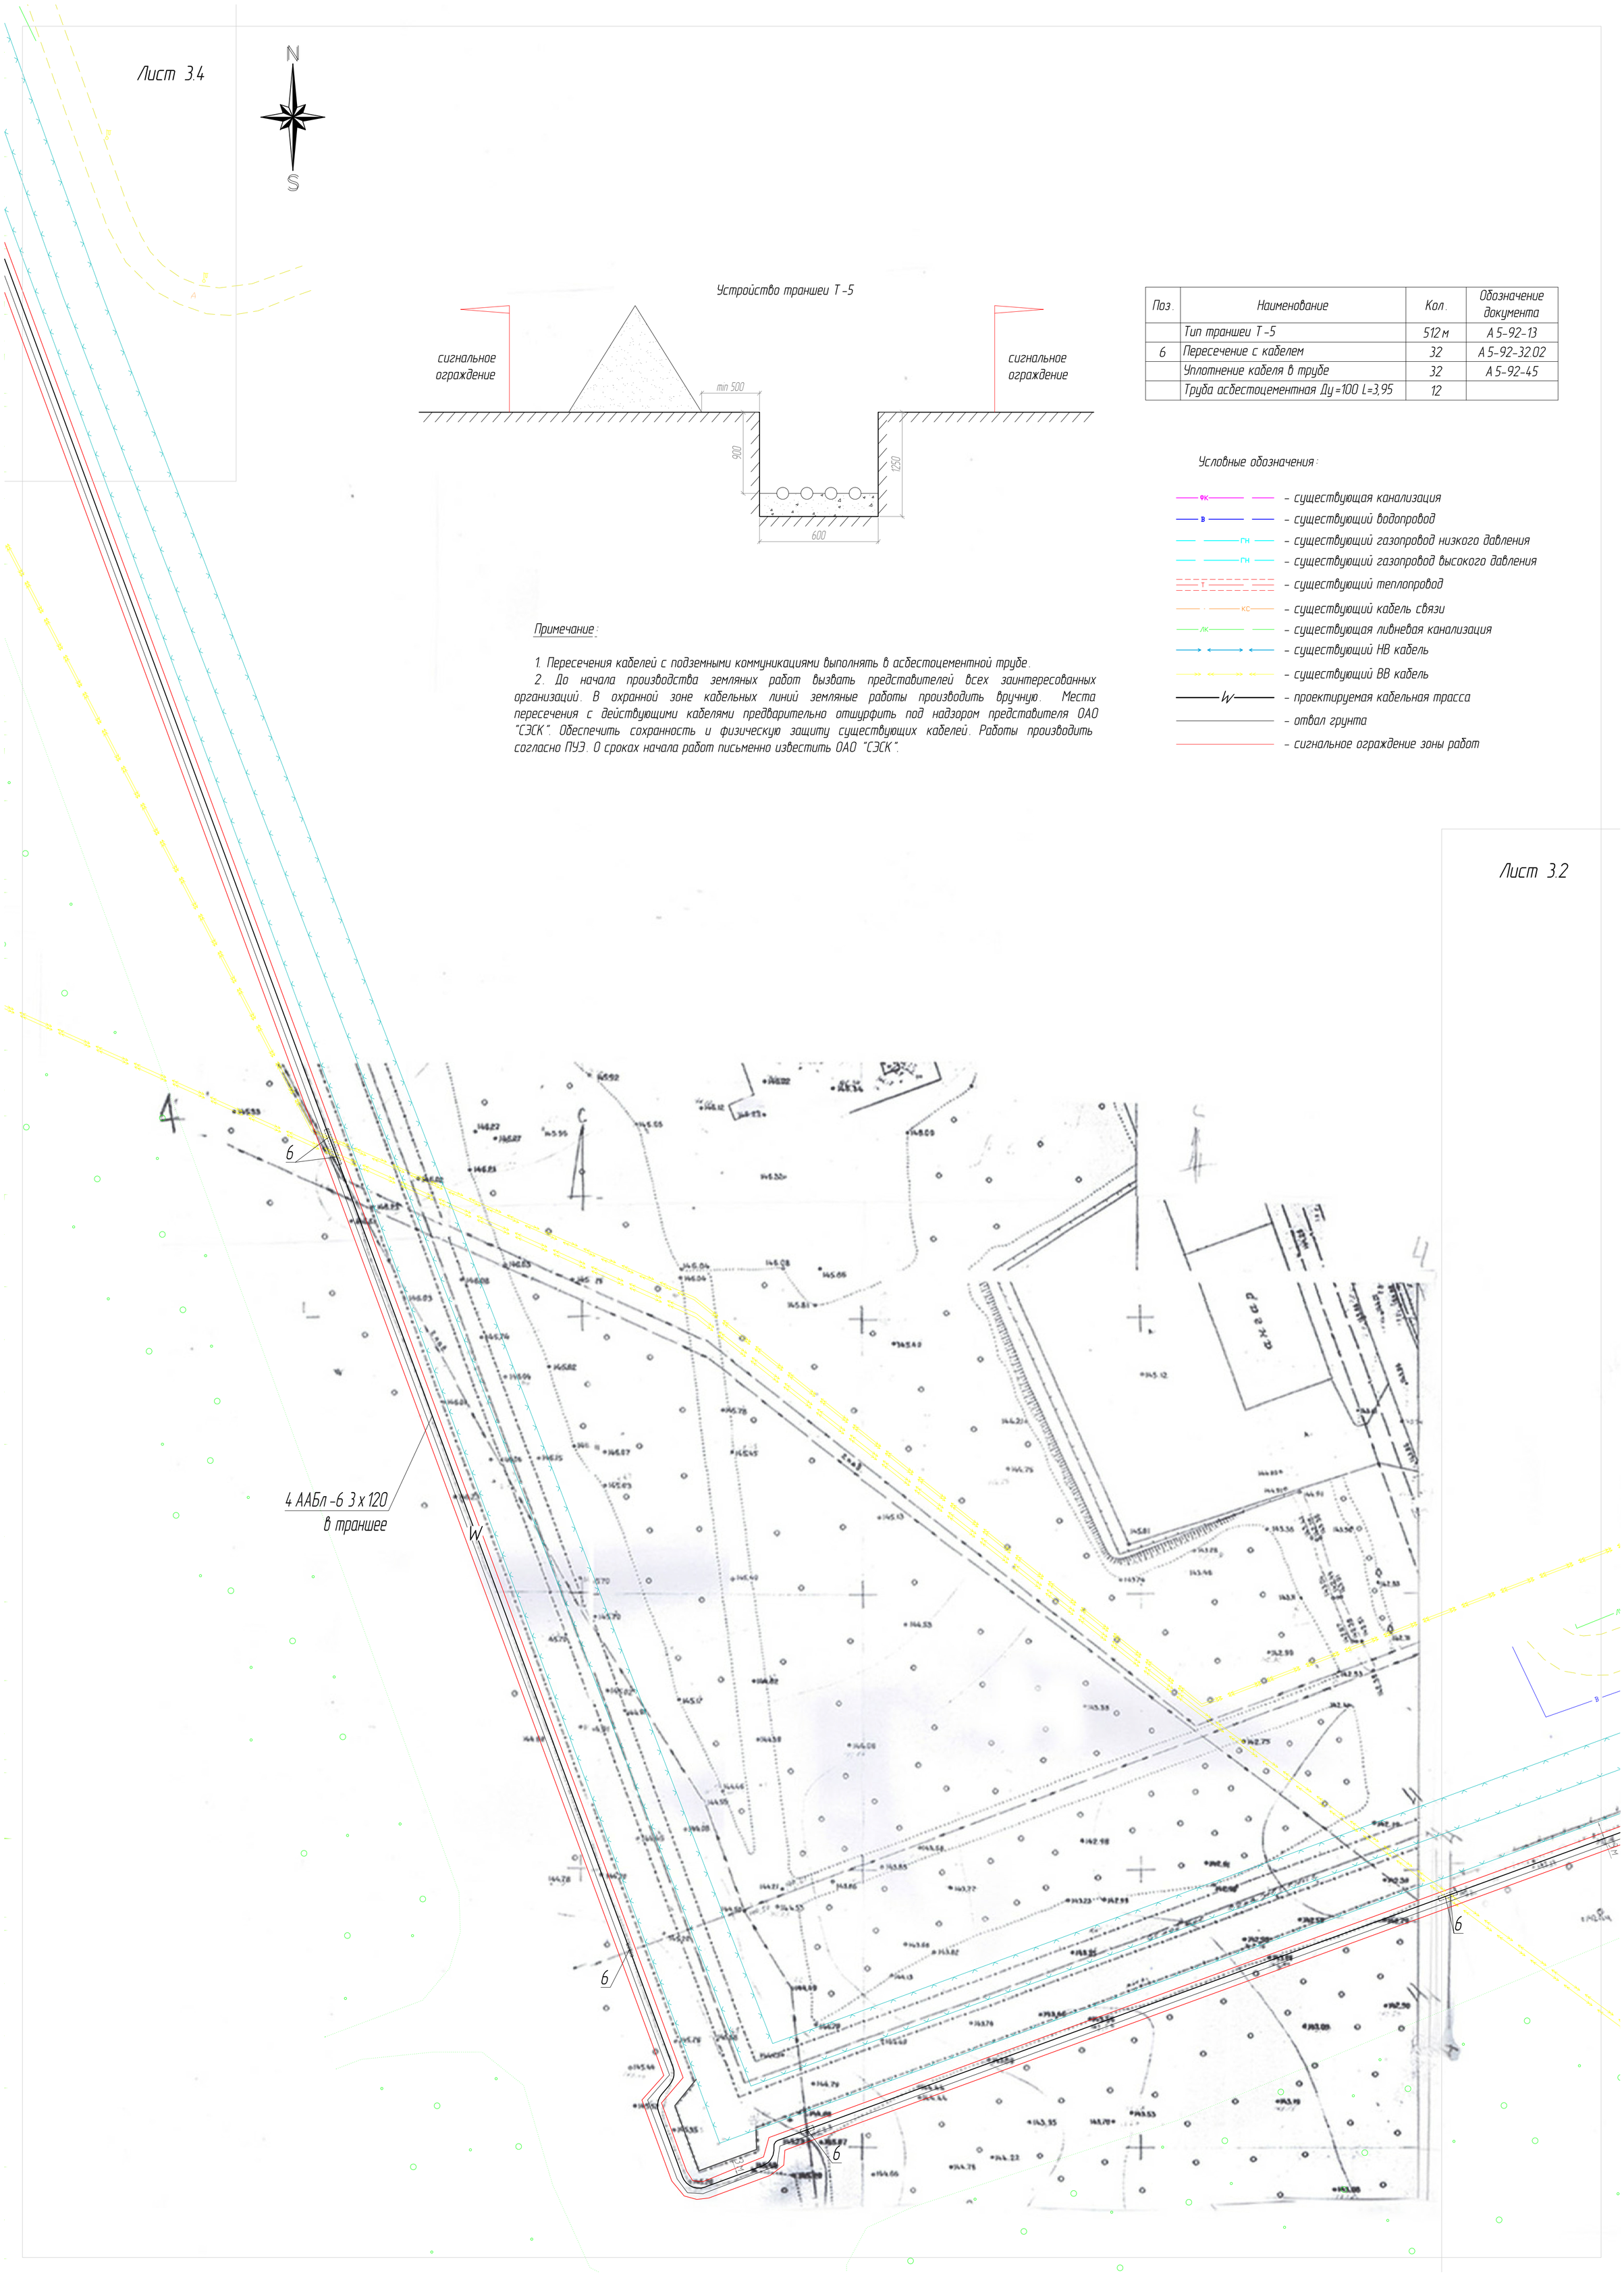

Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
	Тип траншеи Т-5	512 м	А 5-92-13
6	Пересечение с кабелем	32	А 5-92-32.02
	Уплотнение кабеля в трубе	32	А 5-92-45
	Труба асбестоцементная Ду=100 L=3,95	12	

Условные обозначения:

- ФК – существующая канализация
- В – существующий водопровод
- ГН – существующий газопровод низкого давления
- ГН – существующий газопровод высокого давления
- Т – существующий теплопровод
- КС – существующий кабель связи
- ЛК – существующая ливневая канализация
- существующий НВ кабель
- существующий ВВ кабель
- W – проектируемая кабельная трасса
- отвал грунта
- сигнальное ограждение зоны работ

Примечание:

1. Пересечения кабелей с подземными коммуникациями выполнять в асбестоцементной трубе.
2. До начала производства земляных работ вызвать представителей всех заинтересованных организаций. В охранной зоне кабельных линий земляные работы производить вручную. Места пересечения с действующими кабелями предварительно отшурфить под надзором представителя ОАО "СЭСК". Обеспечить сохранность и физическую защиту существующих кабелей. Работы производить согласно ПУЭ. О сроках начала работ письменно известить ОАО "СЭСК".

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подпись	Дата	13/14-1-ПОС	Лист 3.3

Копировал

Формат А1
