
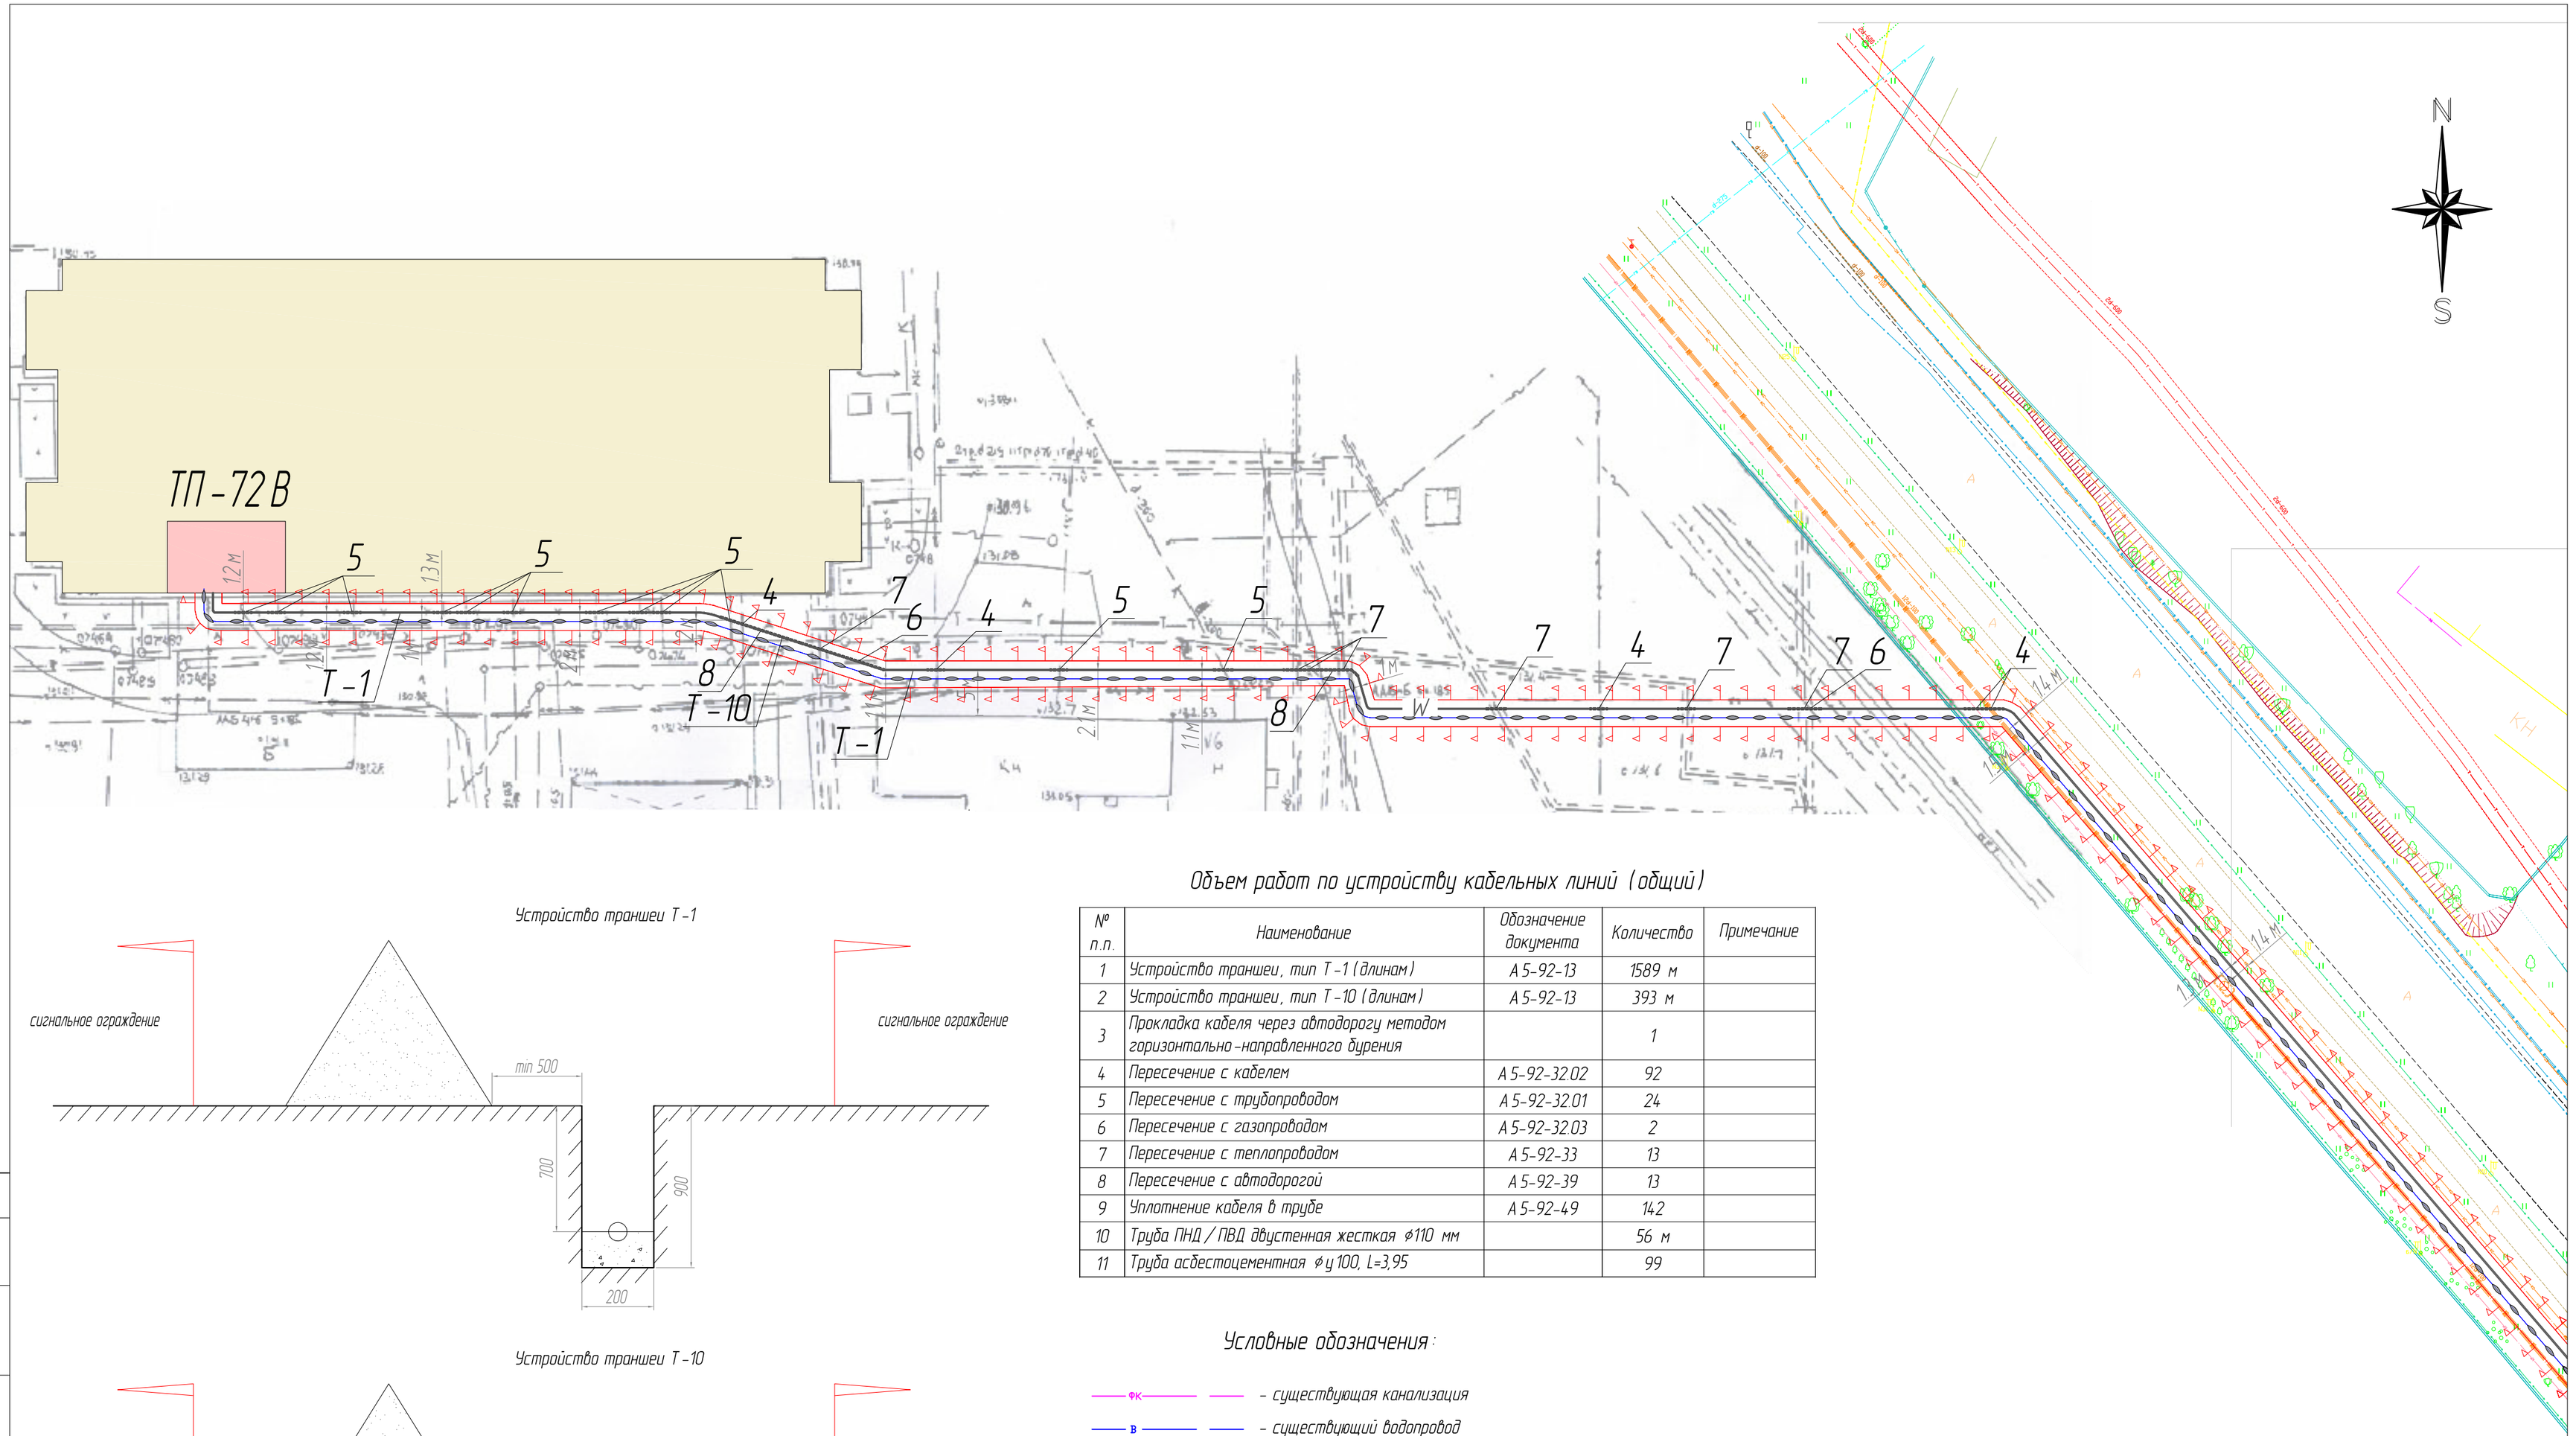


Устройство траншеи Т-1

Устройство траншеи Т-10

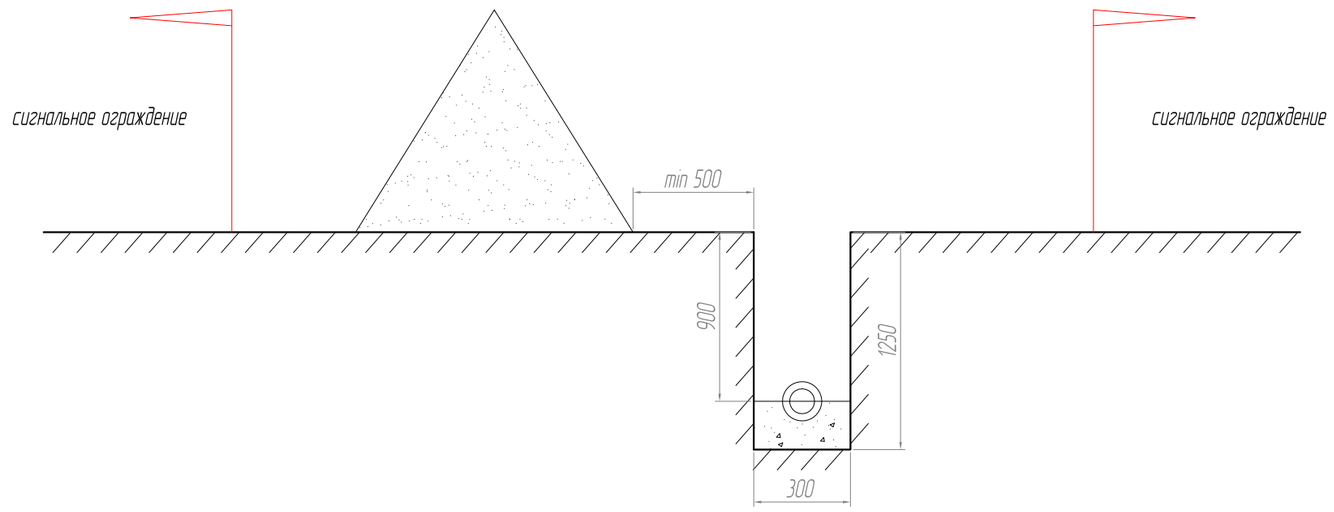

Объем работ по устройству кабельных линий (общий)

№ п.п.	Наименование	Обозначение документа	Количество	Примечание
1	Устройство траншеи, тип Т-1 (длинам)	А 5-92-13	1589 м	
2	Устройство траншеи, тип Т-10 (длинам)	А 5-92-13	393 м	
3	Прокладка кабеля через автодорогу методам горизонтально-направленного бурения		1	
4	Пересечение с кабелем	А 5-92-32.02	92	
5	Пересечение с трубопроводам	А 5-92-32.01	24	
6	Пересечение с газопроводам	А 5-92-32.03	2	
7	Пересечение с теплопроводам	А 5-92-33	13	
8	Пересечение с автодорогой	А 5-92-39	13	
9	Уплотнение кабеля в трубе	А 5-92-49	142	
10	Труба ПНД / ПВД двустенная жесткая ф110 мм		56 м	
11	Труба асбестоцементная ф у 100, L=3,95		99	

Условные обозначения:

- ФК — существующая канализация
- В — существующий водопровод
- ГН — существующий газопровод низкого давления
- ГН — существующий газопровод высокого давления
- Т — существующий теплопровод
- КС — существующий кабель связи
- ЛК — существующая ливневая канализация
- существующий НВ кабель
- существующий ВВ кабель
- W — проектируемая кабельная трасса
- отвал грунта
- сигнальное ограждение зоны работ

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разработал		Корнин			31.10.14
Н.контр.		Кузнецов			31.10.14
ГИП		Кузнецов			31.10.14

13/14-4-ПОС

Нижегородская обл, г. Саров
ОАО "Саровская Электросетевая Компания"

Капитальный ремонт кабельной линии ТЭЦ ф.511-ТП-72В инв. №00540307
Проект организации строительства

Стадия	Лист	Листов
П	3.1	5

План кабельной трассы.
Масштаб 1:500

Саровское Электро Монтажное Управление

Копировал

Формат А2
