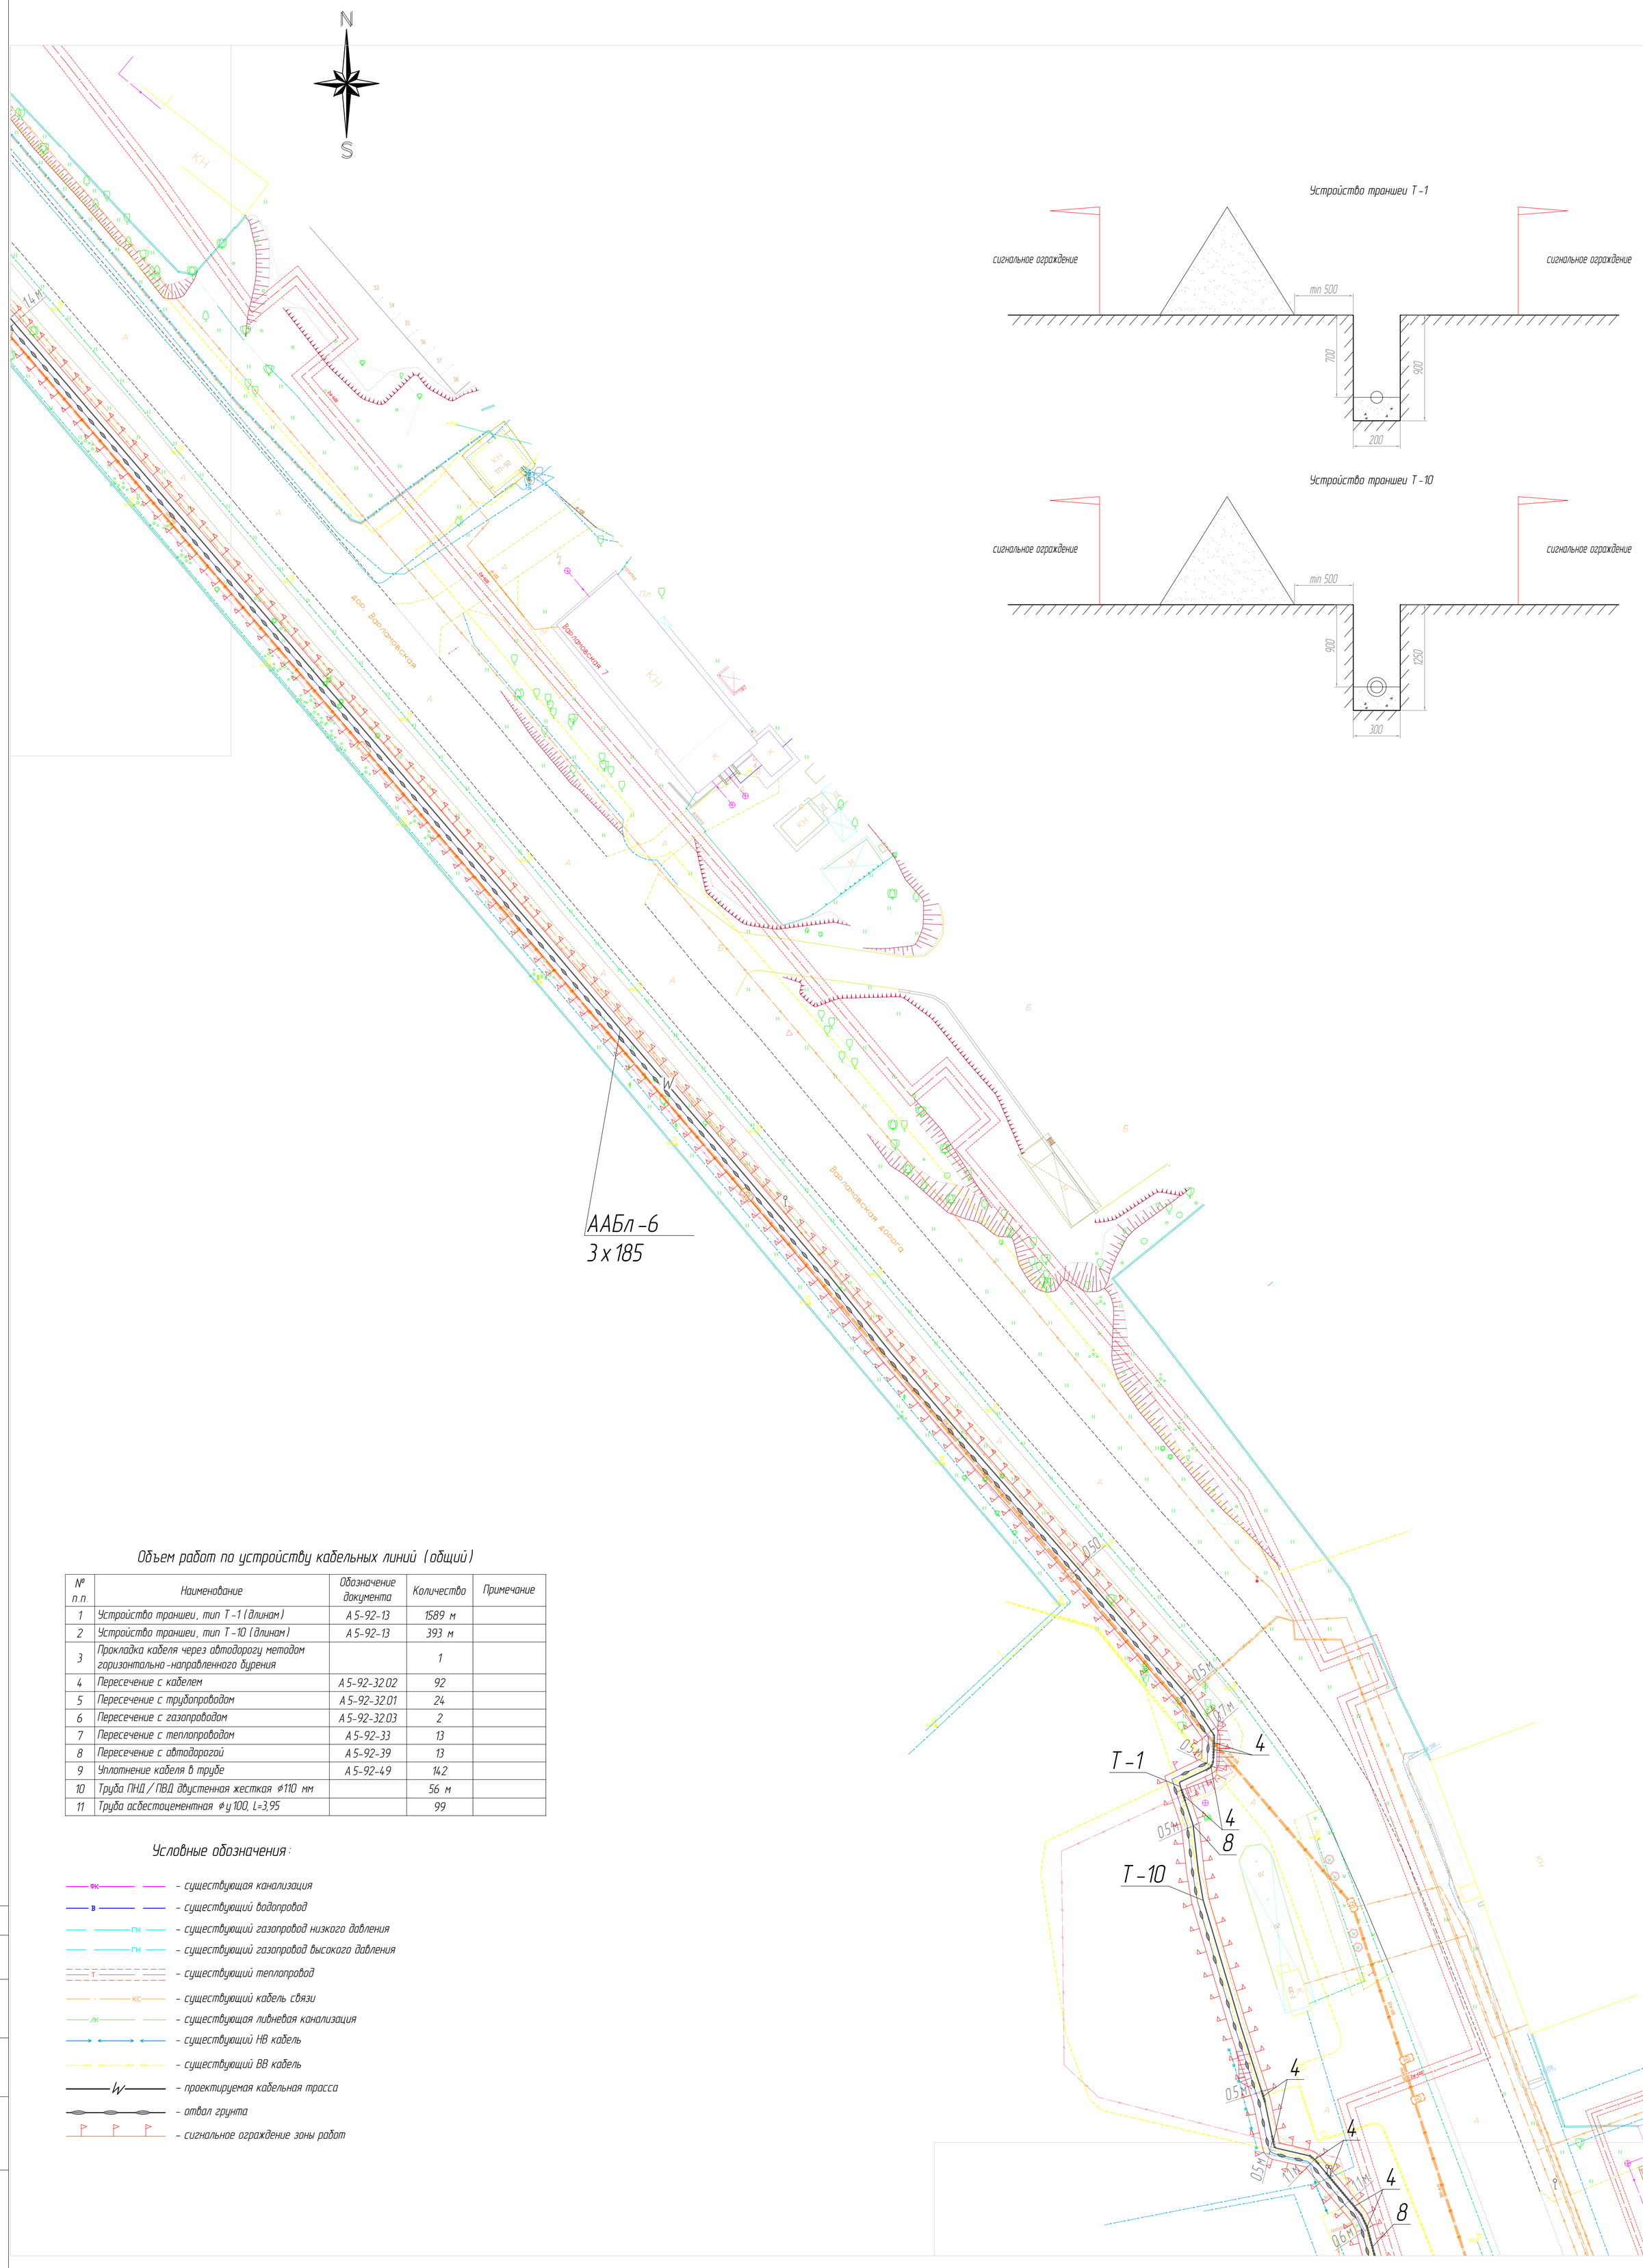


Устройство траншеи Т-1

Устройство траншеи Т-10

Объем работ по устройству кабельных линий (общий)

№ п.п.	Наименование	Обозначение документа	Количество	Примечание
1	Устройство траншеи, тип Т-1 (длинам)	А 5-92-13	1589 м	
2	Устройство траншеи, тип Т-10 (длинам)	А 5-92-13	393 м	
3	Прокладка кабеля через автодорогу методом горизонтально-направленного бурения		1	
4	Пересечение с кабелем	А 5-92-32.02	92	
5	Пересечение с трубопроводом	А 5-92-32.01	24	
6	Пересечение с газопроводам	А 5-92-32.03	2	
7	Пересечение с теплопроводом	А 5-92-33	13	
8	Пересечение с автодорогой	А 5-92-39	13	
9	Уплотнение кабеля в трубе	А 5-92-49	142	
10	Труба ПНД / ПВД двустенная жесткая ф110 мм		56 м	
11	Труба асбестоцементная ф у 100, L=3,95		99	

Условные обозначения:

- ФК — существующая канализация
- В — существующий водопровод
- ГН — существующий газопровод низкого давления
- ГН — существующий газопровод высокого давления
- Т — существующий теплопровод
- КС — существующий кабель связи
- ЛК — существующая ливневая канализация
- существующий НВ кабель
- существующий ВВ кабель
- проектируемая кабельная трасса
- отвал грунта
- сигнальное ограждение зоны работ

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	N°док.	Подпись	Дата	13/14-4-ПОС	Лист 3.2

Копировал

Формат А1
