Лист 2

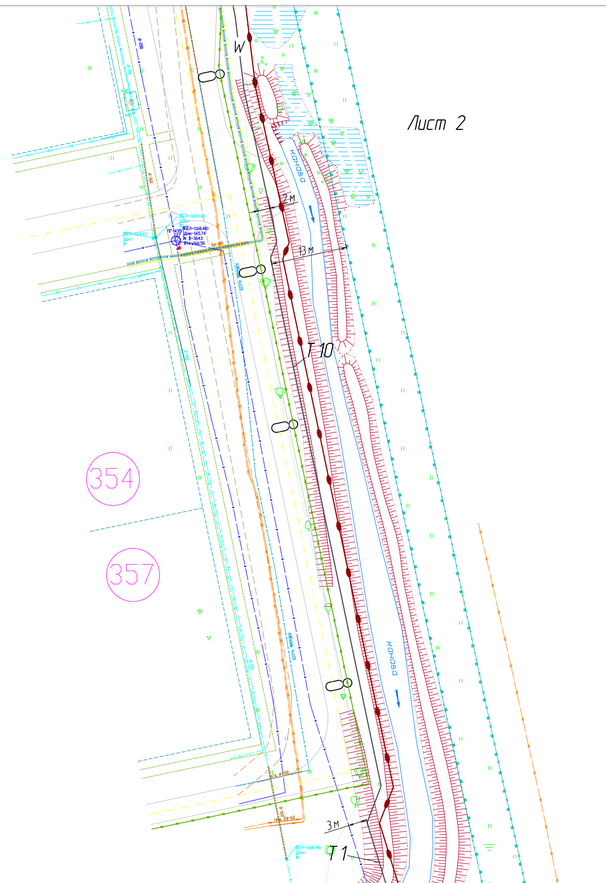

Устроуство траншеи Т-1.

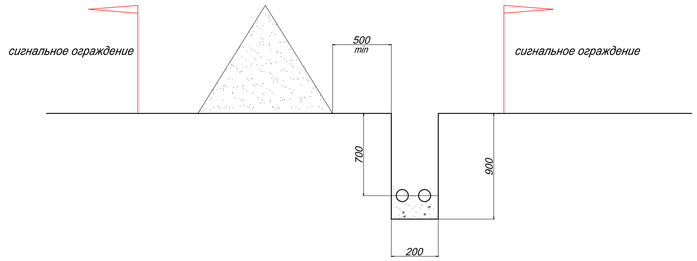

Устроуство траншеи Т-10

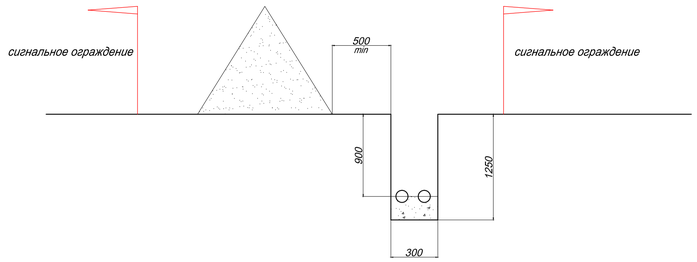

Объём работ по устройству кабельных сооружений				
Поз.	Наименование	Обозначение документа	Количество	Примечание
1.	Устройство траншеи, тип Т-1 (длина,м)	А5-92-13	378	
2.	Устройство траншеи, тип Т-10 (длина,м)	А5-92-13	157	
3.	Пересечение с кабелем	А5-92-32.02	2	
4.	Пересечение с трубопроводом	А5-92-32.01	1	
5.	Пересечение с газопроводом	А5-92-32.03	1	
7.	Уплотнение кабеля в трубе	А5-92-45	5	
8.	Труба асбестоцементная Ду=100 L=3,95		3шт	
	Ведомость монтажных работ			
	Строительные и монтажные работы	Ед. изм.	Количество	Примечание
9.	Рытье траншеи в грунте	м 3	127	
10.	Обратная засыпка траншеи обычным грунтом	м 3	90	
11.	Обратная засыпка траншеи песком	м 3	37	
12.	Прокладка трубы асбестоцементной Ду-100	м	12	
13.	Монтаж кабеля в траншее	м	523	
14.	Монтаж кабеля по каб. конструкциям в ТП	м	15	
15.	Монтаж кабеля в трубе	м	12	

1. До начала производства земляных работ вызвать на место представителей всех заинтересованных организаций. В охранной зоне кабельных линий земляные работы производить вручную. Места пересечения с действующими кабелями предварительно отшурфить под надзором представителя ОАО "СЭСК". Обеспечить сохранность и физическую защиту существующих кабелей.
2. . Отвал грунта и сигнальное ограждение на чертеже показано условно, точное расположение определить в проекте производства работ.
3. Глубина траншеи принята от поверхности земли окончательно спланированной территории

Условные обозначения

- W — Проектируемая кабельная трасса
- Прокладка кабеля в трубе
- Проектируемый водопровод (по отдельному проекту)
- Проектируемая канализация (по отдельному проекту)
- Проектируемый кабель наружного освещения (по отдельному проекту)
- Отвал грунта

АСБ-6 3х25

ТП229

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм	Кол	Лист	№док	Подпись	Дата

8/14-ПОС.1

Лист 3

Копировал

Формат А1
