



АТОМКОМПЛЕКТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Открытое акционерное общество
«АТОМКОМПЛЕКТ»

119180 Российская Федерация, Москва
ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1

Тел.(499) 949-4740 Факс (499) 949-4736

E-mail: info@atomkomplekt.org

ИНН 7706738770 КПП 770601001

ОКПО 66859391 ОГРН 1107746480490

31.10.2013 № 304/0799

О разъяснении положений документации
по запросу предложений (закупка на
<http://www.zakupki.gov.ru>
№ 31300588288, на
<http://zakupki.rosatom.ru>
№ 131003/1065/202,
на <http://www.a-k-d.ru> № R022076)

Участникам открытого одноэтапного
запроса предложений в электронной
форме без квалификационного отбора
на право заключения договора на
изготовление и поставку приводов
СУЗ ШЭМ-3 с комплектом
инструмента и приспособлений,
комплект запасных частей,
комплект изделий для наладки и
регулирования на монтаже,
комплект деталей для
гидроиспытаний чехлов СУЗ для
энергоблоков №1 и №2
Нововоронежской АЭС-2.

Уважаемые господа!

В соответствии с пунктом 14.5.1. Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Госкорпорации «Росатом» ОАО «Атомкомплект», являющееся организатором открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на изготовление и поставку приводов СУЗ ШЭМ-3 с комплектом инструмента и приспособлений, комплект запасных частей, комплект изделий для наладки и регулирования на монтаже, комплект деталей для гидроиспытаний чехлов СУЗ для энергоблоков №1 и №2 Нововоронежской АЭС-2, в соответствии с информацией, полученной от Заказчика, в ответ на запрос участника запроса предложений сообщает следующее:

Вопрос:

Прошу произвести изменения в конкурсной документации, а именно:

1. Установить Срок поставки приводов СУЗ ШЭМ-3:

Энергоблок № 1 - июнь 2016 года:

Энергоблок № 2 - декабрь 2016 года

Срок поставки должен соответствовать Графику исполнения действующих и планируемых договоров по изготовлению и поставке приводов СУЗ ШЭМ-3. направленному в ОАО «ДЕЗ» (инициатору закупки) исх. № 044/2-13/1-12560 от 06.09.2013

2. По тексту проекта Договора:

2.1. Откорректировать пункты договора и исключить из текста договора пункты, касающиеся Шеф-монтажа и Шеф-наладки, а именно п.2.2, 2.3. 4.28. а также 1 приложение №4.

2.2 п. 4.6.изложить в редакции: «Предоставить Заказчику/Генподрядчику документы по результатам испытаний Оборудования (акты, протоколы),

подтверждающие выполнение требований ГОСТ Р 15.201-2000. В период изготовления, приемки, поставки Оборудования 1, 2. и 3 классов безопасности выполнить все требования «Решения о порядке и объеме проведения оценок соответствия оборудования, изделий, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции» № 06-4421 с изм. 3.

2.3. п. 4.7 дополнить: «Согласно Спецификации (приложение № 1 к настоящему договору)».

2.4. п.4.29 заменить «Методические указаниями Заказчика-застройщика «Управление несоответствиями при изготовлении оборудования для АЭС» на «РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 «Положение но управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС».

2.5. Исключить п. 4.15. в п. 6.4.2 исключить ссылку на п. 4.15.

2.6. п.п. 4.9, 4.41 - Исключить.

2.7. п.9.8 изложить в редакции: «Гарантийный срок на поставленное Оборудование, в том числе на Оборудование, поставленное взамен дефектного, исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди.

Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди энергоблока № 2 Нововоронежской АЭС-2: 4 квартал 2016г.»

2.8. п. 9.12-9.14 требуют уточнения: «поломки, возникшие по вине Поставщика»

2.9. Включить пункт 9.15: «Если оборудование было повреждено вследствие небрежного хранения на Площадке АЭС. неправильного обслуживания и если Генподрядчиком или Заказчиком-застройщиком произведены какие-нибудь изменения в конструкции оборудования в течение Гарантийного срока при отсутствии представителя Поставщика или без его письменного согласия, а также при ненадлежащем исполнении требований Технической документации Поставщика со стороны Генподрядчика/ Грузополучателя или Заказчика-застройщика, либо при наличии вины Генподрядчика или Заказчика-застройщика в выявленных несоответствиях и (или) дефектах. Поставщик не несет ответственности за возникновение таких дефектов и несоответствий и снимает гарантийные обязательства по данному оборудованию. Такие дефекты могут быть устранены Поставщиком по письменному соглашению Сторон за счет виновной стороны».

2.10. п. 10.2 - исключить слова: «и возместить ему убытки, не покрытые указанной неустойкой».

2.11. п. 10.4 исключить слова: «сроков передачи и согласования технической документации», а также «до момента передачи и согласования соответствующей технической документации»;

2.12. п. 10.5., 10.6., 10.11., 10.12., 10.13- исключить;

3. В спецификации приводов СУЗ:

-обозначение Привода вместо 392М.06.10 должно быть 407.503;

-обозначение Комплекта инструментов и приспособлений для обслуживания привода СУЗ ШЭМ-3 должно быть 407.503.09 ;

-обозначение Комплекта запасных частей для приводов СУЗ ШЭМ-3 должно быть 407.503.11;

-обозначение Комплекта изделий для наладки и регулирования на монтаже должно быть 407.503.10;

-обозначение Комплекта деталей для гидроиспытаний чехлов СУЗ в составе реактора должно быть 407.503.16.

Ответ:

По пунктам 1, 2.4.- 2.9., 2.12:

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений и документацию по запросу предложений от 30.10.13 № 304/6738 размещено на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (<http://www.zakupki.gov.ru>), на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (<http://zakupki.rosatom.ru>) и на ЭТП «Аукционный конкурсный дом» <http://www.a-k-d.ru>.

По пунктам 2.1., 2.2., 2.3., 2.10., 2.11., 3: изменения вноситься не будут.


Вопрос:

Прошу Вас перенести срок подачи заявок на 08.11.2013 в целях детальной проработки, и как следствие, предоставления актуального ценового предложения в составе заявки на участие в запросе предложений.

Ответ:

Срок окончания подачи заявок на участие в запросе предложений продлен согласно извещению о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений и документацию по запросу предложений от 30.10.13 № 304/6738.

Генеральный директор

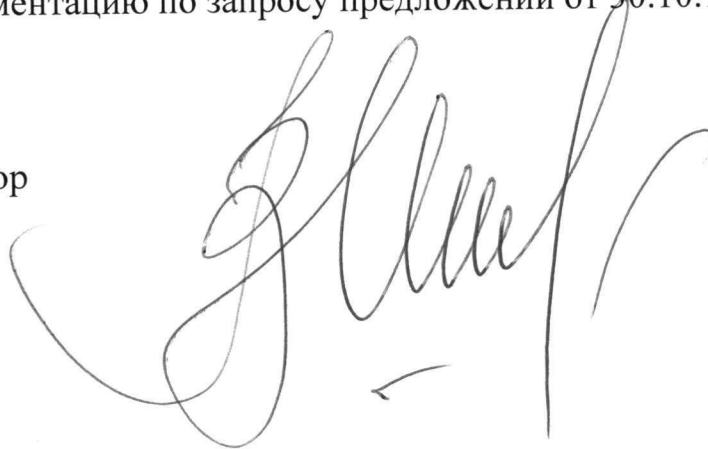

В.К. Широков
