

Приложение № 4  
(Приложение № 6)  
к соглашению № 9  
к Договору от 15.08.2008 № 08108/378

*2008/23.1/20046-9*

01.04.2010

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о тематическом планировании, отчетности и формировании**  
**компенсирующих мероприятий, осуществляемых в процессе**  
**строительства энергоблоков № 1 и № 2 НОВОВОРОНЕЖСКОЙ**  
**АЭС-2**

## Принятые сокращения

КВЛ – капитальные вложения  
 СМР – строительно - монтажные работы  
 ПИР – проектно-изыскательские работы  
 ПНР – пуско-наладочные работы  
 МТР – материально-технические ресурсы

## I. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Договора \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г. (далее – Договор) и устанавливает общий порядок тематического планирования, отчетности и формирования компенсирующих мероприятий, осуществляемых Генподрядчиком в процессе строительства энергоблоков № 1 и № 2 Нововоронежской АЭС-2.

Термины и определения, использованные в настоящем Положении имеют те же значения, которые для них определены в ст.1 Договора.

1.2. Планирование работ осуществляется на основании Графика сооружения Нововоронежской АЭС-2 1-го уровня (графика основных событий), разработанного в соответствии с Приложением № 1 к Договору.

1.3. Генподрядчик на основании Графика сооружения «Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками №1 и № 2» 1-го уровня, составляет График сооружения 3-го уровня (в соответствии с Приложением № 2 к Договору), а также план освоения КВЛ (по Оборудованию – использование средств на закупку) и финансирования по Проекту сооружения энергоблока АЭС, с разбивкой по годам. На основании плана освоения КВЛ (всего Проекта сооружения Нововоронежской АЭС-2) Генподрядчик составляет Тематический план работ на предстоящий год по каждому объекту, с учетом результатов работы прошедших периодов, включающий план СМР, план ПИР, план освоения оборудования, план использования средств на закупку Оборудования, план ПНР (Приложения 1-4 к настоящему Положению).

1.4. План направляется Заказчику для согласования и формирования Внутрипостроечного титульного списка на планируемый год строительства энергоблоков №1 и №2 Нововоронежской АЭС-2.

1.5. Объем выполняемых работ на планируемый год должен соответствовать объему работ, определенному в Дополнительном соглашении на каждый календарный год к Договору на сооружение энергоблоков №1 и №2 Нововоронежской АЭС-2.

1.6. После определения годового плана Генподрядчик производит поквартальную разбивку и определяет месячные тематические планы.

1.7. Генподрядчик ежеквартально (ежемесячно) предоставляет тематические планы освоения КВЛ по каждому объекту и ежемесячно отчитывается перед Заказчиком о выполнении планов.

1.8. С учетом фактически выполненных работ, Генподрядчик вносит необходимые корректировки в квартальные и месячные планы, без изменения общей годовой стоимости работ и срока начала и окончания работ по критическому пути графика выполнения работ. После чего направляет их Заказчику.

## II. Цели тематического планирования

2.1. Обеспечить сооружение энергоблоков №1 и №2 Нововоронежской АЭС-2 в соответствии с условиями Договора.

2.2. Обеспечить полную увязку:

- Сроков выпуска Рабочей документации со сроками выполнения Работ.
- Сроков выполнения работ и поставок МТР и Оборудования.
- Выполнения работ в соответствии с приложением № 6 к Дополнительному соглашению на каждый календарный год «График выполнения Работ и услуг по Платежным этапам».

2.3. Обеспечить действенный контроль исполнения планов работ, нормативной выработки и своевременное принятие корректирующих управленческих решений, направленных на исключение отставания в освоении выделенных средств и предотвращения их нецелевого использования, а также на соблюдение сроков сдачи Нововоронежской АЭС-2 в промышленную эксплуатацию.

2.4. Повысить эффективность и организационную дисциплину взаимодействия Генподрядчика с Субподрядчиками и Поставщиками с одной стороны и Заказчика с Генподрядчиком с другой стороны.

## III. Формы и содержание документов, обеспечивающих тематическое планирование

3.1. На основании плана работ на год Генподрядчик составляет квартальные (ежемесячные) тематические планы работ по следующим направлениям:

- на выполнение строительно-монтажных работ по форме-образцу в соответствии с Приложением № 1;
- на поставку оборудования по форме-образцу в соответствии с Приложением № 2;
- на освоение оборудования по форме-образцу в соответствии с Приложением №2 «А»;
- на выполнение проектно-изыскательских работ по форме-образцу в соответствии с Приложением № 3;
- на выполнение пуско-наладочных работ по форме-образцу в соответствии с Приложением № 4;

3.2. Установить следующие сроки передачи Генподрядчиком Заказчику тематических планов работ:

- план освоения КВЛ на следующий год до 01 ноября текущего года;
- план выполнения работ на квартал, с разбивкой по месяцам в срок до 28 числа месяца, перед планируемым кварталом;
- план выполнения работ на месяц в срок до 28 числа текущего месяца на предстоящий месяц.

План выполнения работ на следующий месяц текущего квартала составляется с учетом фактического выполнения работ за предыдущий месяц и освоения финансовых средств.

## IV. Порядок определения стоимости в текущем уровне цен

4.1. Цена Работ и услуг, учитываемая при составлении Тематических планов и отчетности, должна соответствовать цене соответствующих Работ и услуг,

определенной в Приложении № 7 к Дополнительному соглашению на каждый календарный год «Сметный расчет цены Работ и услуг по Платежным этапам».

## **V. Порядок отчетности по выполненным работам**

5.1. Генподрядчик представляет Заказчику не позднее 1 (первого числа), следующего за отчетным периодом (год, квартал, месяц), отчеты об освоении капитальных вложений за отчетный период:

- по СМР – по форме-образцу в соответствии с Приложением № 5;
- по оборудованию – по форме-образцу в соответствии с Приложением № 6;
- остаточная (хвостовая) ведомость потребности оборудования и ТМЦ для освоения остаточных объемов КВЛ на строительстве объектов Приложением № 7;
- по ПИР – по форме-образцу в соответствии с Приложением № 8;
- по ПНР – по форме-образцу в соответствии с Приложением № 9;
- ежемесячный отчет – по форме-образцу в соответствии с Приложением № 10.

5.2. Генподрядчик представляет Заказчику предварительный ежемесячный отчет в соответствии с Приложением № 10 к настоящему Положению за декабрь текущего года не позднее 10 декабря текущего года. Отчет должен быть выполнен по фактическим данным по состоянию на 10 декабря с учетом прогноза выполнения Работ и услуг до конца года.

## **VI. Формирование компенсирующих мероприятий**

6.1. Генподрядчик представляет Заказчику тематические планы и отчеты о выполнении тематического плана, разработанные в соответствии с заключенными договорами на текущий год и утвержденными графиками производства работ.

6.2. В случае отклонения тематического плана от договорных обязательств (отставания в освоении выделенных финансовых средств) и графиков производства работ (отставание по срокам) осуществляется фиксирование отклонения в письменном виде, выявляются причины отклонения и Генподрядчиком вводятся компенсирующие мероприятия по устранению выявленных отклонений и вхождению в график выполнения работ.

6.3. Генподрядчик разрабатывает план-график компенсирующих мероприятий по устранению выявленных отклонений (замечаний) и по вхождению в график выполнения работ, с назначением ответственных лиц по исполнению каждого конкретного пункта и указанием сроков исполнения, и согласовывает его с Заказчиком.

6.4. Тематическое планирование следующего периода осуществляется Генподрядчиком с учетом ликвидации отставания в отчетном периоде и вхождения в график производства работ и согласовывается с Заказчиком.

## **VII. Прочие условия**

7.1. Настоящее Положение с приложениями является неотъемлемой частью Договора.

7.2. Настоящее Положение с приложениями вступает в силу с момента подписания и действует до момента полного выполнения Сторонами обязательств по Договору, включая исполнение гарантийных обязательств в соответствии со статьей 27 Договора.

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, действуют условия Договора.

7.4. Настоящее Положение с приложениями подлежит анализу и пересмотру в случае необходимости.

7.5. Настоящее Положение с приложениями составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.6. Неотъемлемой частью настоящего Положения являются следующие приложения:

Приложение № 1.	Тематический план ОАО «Атомэнергопроект» выполнения строительно-монтажных работ и освоения капитальных вложений на _____ месяц, квартал, 201__ г. по строительству объектов по проекту «Нововоронежская АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2» согласно договора генподряда от _____ № _____.
Приложение № 2	Тематический план ОАО «Атомэнергопроект» на поставку оборудования для филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Нововоронежской АЭС-2» на _____ квартал (месяц), 201__ г. для строительства объектов по проекту «Нововоронежская АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2» согласно договору от _____ 200 г. № _____.
Приложение № 2 «А»	Тематический план ОАО «Атомэнергопроект» освоения оборудования на _____ квартал (месяц), 201__ г. для строительства объектов по проекту «Нововоронежская АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2» согласно договору от _____ 201 г. № _____.
Приложение № 3	Тематический план на выполнение проектно-изыскательской документации за _____ 201__ г. по сооружению объектов по проекту «Нововоронежская АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2».
Приложение № 4	Тематический план выполнения пуско-наладочных работ на _____ 201__ г. по строительству объектов по проекту «Нововоронежская АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2».
Приложение № 5	Отчет о выполнении тематического плана ОАО «Атомэнергопроект» по выполнению строительно-монтажных работ и освоения капитальных вложений за _____ месяц, квартал, 201__ г. по строительству объектов по проекту «Нововоронежская АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2» согласно договора генподряда от _____ № _____.
Приложение № 6	Отчет о выполнении тематического плана ОАО «Атомэнергопроект» по поставкам оборудования за _____ квартал (месяц), 201__ г. для строительства объектов по проекту «Нововоронежская АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2» согласно договора поставки от _____ № _____.
Приложение № 6 «А»	Отчет о выполнении тематического плана ОАО «Атомэнергопроект» по освоению оборудования за _____ квартал (месяц), 201__ г. для строительства объектов по проекту «Нововоронежская АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2».
Приложение № 7	Остаточная (хвостовая) ведомость потребности оборудования и ТМЦ для освоения остаточных объемов КВЛ на строительстве объектов по проекту «Нововоронежская АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2» по состоянию на _____ 201__ г.
Приложение № 8	Отчет выполнения проектно-изыскательской документации за _____ 201__ г. по сооружению объектов по проекту «Нововоронежская АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2».
Приложение № 9	Отчет по выполнению пуско-наладочных работ по строительству объектов по проекту «Нововоронежская АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2» за квартал _____ 201__ г. согласно договору от _____

\_\_\_\_\_.200\_ № \_\_\_\_\_ к Договору от \_\_\_\_\_  
 № \_\_\_\_\_.

Приложение № 10

Типовое содержание ежемесячного отчета.

### ПОДПИСИ СТОРОН:


От Заказчика:


Генеральный директор  
 ОАО «Концерн Росэнергоатом»

 Обозов

От Генподрядчика:

Первый заместитель генерального  
 директора – директор по  
 проектированию объектов

 И.И. Копытов

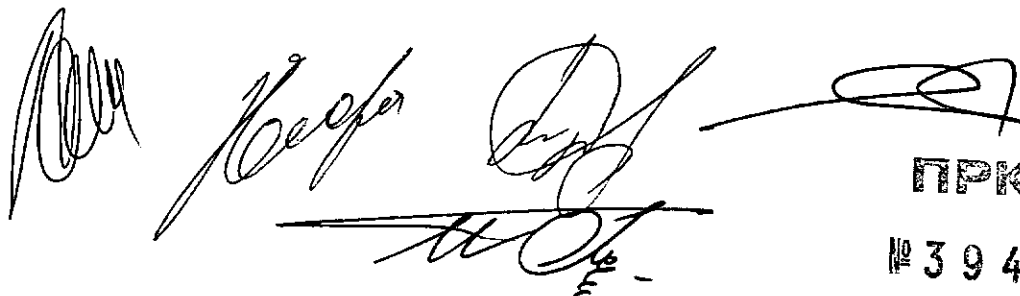

ПРКД

№ 39410

"Утверждаю"

Руководитель генеральной организации (ОАО "Атомэнергoproект")

\_\_\_\_\_  
(И.О. Фамилия)

\_\_\_\_\_  
201\_\_г.

"Утверждаю"

Заместитель Генерального директора - директор по капитальному строительству  
ОАО "Концерн Росэнергоатом"

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
201\_\_г.

Директор

филиала ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Дирекция строящейся Нововоронежской АЭС-2"

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
201\_\_г.

Тематический план

ОАО "Атомэнергoproект"

(наименование организации Генерального подрядчика)

выполнения

строительно-монтажных работ и освоения капитальных вложений на \_\_\_\_\_ месяца, квартал, 2010г.  
по строительству объектов по проекту "Нововоронежская АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2" согласно договора генподряда от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

номер объектной и локальной смет	Наименование объектов, локальных смет видов работ, принятых для исполнения Генеральным подрядчиком, согласно Тематического задания Заказчика	Единица измерения	Количество физ.объемов работ			Сметная стоимость работ в базисной цене п.2000г. (тыс.руб)			Ожидаемый остаток сметной стоимости работ по состоянию на начало _____месяц, квартал 200__г. в базисной цене п.2000г. (тыс.руб)			Принятый план освоения КВЛ (СМР, оборуд., прочие работы и трудоузатраты) сметной ст-ти на _____месяц, квартал 200__г. в базисной цене п.2000г./тек.ценах (тыс.руб)						Плановый индекс дефлятора на _____кв-л 200__г
			Всего по смете	Остаточ. объем по сост. на _____г.	Объем по плану _____г.	Всего	В т.ч. СМР	Оборудование	Всего	В т.ч. СМР	В т.ч. оборудование	Трудоузатраты						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

Составлено:

Начальник производственно-технического отдела Генподрядчика  
Начальник сметно-договорного отдела Генподрядчика  
Начальник отдела комплектации оборудования

Согласовано:

Главный инженер УКС

Начальник отдела технического надзора Заказчика-застройщика

Начальник отдела управления проектом Заказчика-застройщика

Согласовано:

Руководитель ДКС концерна "Росэнергоатом"

Руководитель ДЭФО концерна "Росэнергоатом"

Руководитель ДИЗ концерна "Росэнергоатом"

"Утвержден"

Заместитель Генерального директора - директор по капитальному строительству

WORTHINGTON

2017

Директор  
филиала ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Дирекция строящейся Нововоронежской АЭС-2"

---

ОАО "Атомэнергонефтег"

ОАО "Атомэнергoproject"

Содержание

оборудования филиалу ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Дирекция строящейся Нововоронежской АЭС-2" на \_\_\_\_\_ квартал (месяц), 2010г. для

Стр.	№ п/п	Содержание	г. №
1	2	3	4
1	1	Строительства объектов по проекту "Нововоронежская АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2" согласно договору от	200 г. №

Номер объектной и локальной смет	Наименование объектов, локальных смет и перечней МТР, видов оборудования по этим сметам	Количество по смете		Сметная стоимость МТР, оборудования в базисной цене 2000 г. (тыс.руб)	Всего ожидаемый остаток: количества и сметной стоимости (сметного лимита) оборудования по состоянию на начало _____ мес., кв. 200__ г. в базисной цене _____ 2000 г. (тыс.руб)		Стоимость в базисной цене 2000 г.	Количество в ед. изм.	Всего в базисных ценах 2000 г.	Всего в текущих ценах по сост. На _____ мес., кв. 200__ г. (тыс.руб)	без НДС за 200__ г. (тыс.руб)	Плановый индекс - обопылаования
		Ед. изм.	Всего по смете		Единицы оборудования по смете	Всего по смете						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Начальник производственно-технического отдела Генпоставщика (поставщика)

Начальник отдела комплектации оборудования Генпостовщика (поставщика)

Начальник сметно-договорного отдела Гипоставинка (поставщика)

Согласовано: \_\_\_\_\_  
Главный инженер УКС

Начальник отдела комплектования Заказчика-застройщика

Начальник отдела управления проектом Заказчика-застройщика

Начальник производственно-технического отдела Заказчика-застройщика

Согласовано: \_\_\_\_\_  
Руководитель ДКС концерна "Росэнергоатом"

Руководитель ДЭФО концерн "Росэнергоатом"

Руководитель ДИЗ концерн "Росэнергоатом"



Руководитель генподрядной организации (ОАО "Атомэнергопроект")

\_\_\_\_\_, (И.О.Фамилия)  
 " " 201 г.

Заместитель Генерального директора - директор по капитальному строительству  
ОАО "Концерн Росэнергоатом"

\_\_\_\_\_ ( )  
" " 201 г.

Филиала ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Дирекция строящейся Нововоронежской АЭС-2"

201 г.

**ОАО "Атомэнергострой"**

(наименование организации Генерального подрядчика)

## ОСВОЕНИЯ

оборудования на \_\_\_\_\_ квартал (месяц), 2010г. для  
(Наименование организации)

Нововоронежская АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2" согласно договору от 200 г. №

[illegible]

Начальник производственно-технического отдела Генпостовщика (поставщика)

Начальник отдела комплектации оборудования (поставщика)

Начальник сметно-договорного отдела Гниставщина (поставщик)

Главный инженер УКС

**Согласовано:**

Начальник отдела комплектации оборудования Заказчика-застройщика

**Начальник отдела управления проектом Заказчика-застройщика**

Начальник производственно-технического отдела Заказчика-застройщика

Руководитель ДКС концерна "Росэнергоатом"

Руководитель ДЭФО концерна "Росэнергоатом"

Руководитель ДИЗ концерна "Росэнергоатом"

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер генеральной проектной  
организации (ОАО "Атомэнергoproект")

" " 201 г.

Принят к исполнению

инженер проекта генеральной проектной организации (ОАО  
"Атомэнергoproект")

" " 201 г.

Главный

инженер проекта генеральной проектной организации (ОАО  
"Атомэнергoproект")

" " 201 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Генерального директора - директор по капитальному строительству  
ОАО "Концерн Росэнергоатом"

" " 201 г.

Директор филиала ОАО "Концерн  
Росэнергоатом" "Дирекция строящейся  
Нововоронежской АЭС-2"

" " 201 г.

Тематический план

на выполнение проектно-изыскательской документации за 2010 г. по строительству объектов по проекту "Нововоронежская АЭС-2  
с энергоблоками №1 и №2"

№ и/и договора	Наименование проектных работ (раздела и темы проектных работ), объекта строительства внутрипроектного титового списка (ВПТС)	Стадия проектирования		Сметная		Выполнено ПИР		Сроки выполнения работ		Выполнено ПИР		Остаток сметной		учетом выполн.		План освоения		Нижне-дефлятор на		Наименование тематических и целевых задач, разделов, подлежащих выполнению	Полное название проектной организации- исполнителя
		цены 2000г.	текущие цены	цены 2000г.	текущие цены	цены 2000г.	текущие цены	по гл.12,смете и договору	по гл.12,смете с начала проектирования на 31.12.200 г.	по календарному плану договора	цены 2000г.	текущие цены	с начала года на 01 - 200 г.	Остаток сметной стоимости ПИР по гл.12 с	текущие цены за кв 200 г. по сост. на 01 - 200 г.	цены 2000г.	текущие цены	ПИР по гл.12 в смете на квартал 200 г.	Нижне-дефлятор на планируемый период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Всего:																					

Составители:

Начальник ПТО ОАО "Атомэнергoproект" ( )

Согласовано:

Главный инженер УКС

Начальник ПТО УКС

Начальник ОУП УКС

Согласовано:

Руководитель ДКС концерна "Росэнергоатом"

Руководитель ДЭФО концерна "Росэнергоатом"

Руководитель ДИЗ концерна "Росэнергоатом"

Приложение № 4

к Положению о тематическом планировании, отчетности...

"Утверждаю"

Руководитель генподрядной организации (ОАО "Атомэнергопроект")  
по пусконаладочным работам

\_\_\_\_\_ (И.О. Фамилия)

" " \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

"Утверждаю"

Заместитель Генерального директора - директор по капитальному строительству  
ОАО "Концерн Росэнергоатом"

\_\_\_\_\_ ( " " \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

" " \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

Директор

филиала ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Дирекция строящейся Нововоронежской АЭС-2"

" " \_\_\_\_\_ ( " " \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

Тематический план

выполнения пуско-наладочных работ на \_\_\_\_\_ 2010г.

по строительству объектов по проекту "Нововоронежская АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2"

тыс.руб.

Номера объектной и локальных смет	Наименование объектных, локальных смет видов работ, принятых для исполнения Генеральным подрядчиком, согласно Тематического задания Заказчика-застройщика	Вид ПНР («Входоступ», «под нагрузкой»)	Сметная стоимость работ в базисной цене/в текущих ценах без НДС		Ожидаемый остаток сметной стоимости работ по состоянию на _____ кв. 200 ____ г. в базисной цене/в текущих ценах без НДС		Принятый план освоения КВИ (СМР, оборуд., прочие работы и трудозатраты) сметной стоимости на _____ кв. 200 ____ г. в базисной цене/в текущих ценах без НДС		Плановые индексы- дефляторы на ____ кв. 200 ____ г.
			ц.2000г	тек.цены	ц.2000г	тек.цены	ц.2000г	тек.цены	
1	2	3	4	5	6	7			

План разработан:

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фпо)

"Утверждаю"

Руководитель генподрядной организации (ОАО "Атомэнергoproект")

" " (И.О. Фамилия) 201 г.

"Утверждаю"

Заместитель Генерального директора - директор по капитальному строительству  
ОАО "Концерн Росэнергоатом"

" " 201 г.

Директор

филиала ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Дирекция строящейся Нововоронежской АЭС-2"

" " 201 г.

# Отчет о выполнении тематического плана

ОАО "Атомэнергoproект" по выполнению  
(наименование организации Генерального подрядчика)

строительно-монтажных работ и освоению капитальных вложений за \_\_\_\_\_ месяц, квартал, 2010г.  
по строительству объектов по проекту "Нововоронежская АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2" согласно договора генподряда от № \_\_\_\_\_

номер объектной и локальной смет	Наименование объектов, локальных смет, и объектов Внутривозвращенного титульного списка	Сметная стоимость работ в базисной цене ц.2000г. (тыс.руб)		План-задание по освоению КВЛ по сметной ст-ти на _____ месяц, квартал 200 г. В базисной цене ц.2000г./тек.ценах (тыс.руб)		Фактическое исполнение месячного (квартального) задания в базисной цене ц.2000г./тек.ценах (тыс.руб)					
		Всего	В т.ч. СМР	Оборудование	Всего	В т.ч. СМР	В т.ч. оборудование	В т.ч. текущие цены	В т.ч. СМР	В т.ч. текущие цены без НДС	В т.ч. текущие цены без НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Составлено:

Начальник производственно-технического отдела Генподрядчика  
Начальник сметно-договорного отдела Генподрядчика  
Начальник отдела комплектации оборудования

Согласовано:

Главный инженер УКС  
Начальник отдела технического надзора Заказчика-застройщика  
Начальник отдела управления проектом Заказчика-застройщика

Согласовано:

Руководитель ДКС концерна "Росэнергоатом"  
Руководитель ДЭФО концерна "Росэнергоатом"  
Руководитель ДИЗ концерна "Росэнергоатом"

"Утверждаю"

Руководитель генеральной организации (ОАО "Атомэнергопроект")

\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_" 200\_\_ г.  
(И.О. Фамилия)

"Утверждаю"

Заместитель Генерального директора - директор по капитальному строительству  
ОАО "Концерн Росэнергоатом"

\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_" 201\_\_ г.

Директор

филиала ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Дирекция строящейся Нововоронежской АЭС-2"

\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_" 201\_\_ г.

Отчет о выполнении тематического плана

ОАО "Атомэнергопроект" \_\_\_\_\_ по поставкам  
(наименование организации Генерального поставщика, кому задается задание на поставку)

оборудования за \_\_\_\_\_ квартал (месяц), 2010г. для строительства объектов по проекту  
"Нововоронежская АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2" согласно договору поставки от \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. № \_\_\_\_\_

номер пункта тематического плана	номер объектов и локальных смет	наименование объектов, локальных смет и перечень видов оборудования	Ед. изм	Количество			Сметная стоимость оборудования в базисной цене 2000 г. (тыс.руб)		План поставки оборудования по стоимости (финансирования) без НДС на ____ мес., кв. 200__ г (тыс.руб)	Исполнение Тематического задания (фактически поставлено поставщиком) за ____ мес., кв. 200__ г (тыс.руб)							
				Всего по смете	Всего остаток	План поставки на ____ мес., квартал 200__ г.	Единицы	Всего		Единицы	Всего	Поставленное количество	использовано сметного лимита в базисных ценах 2000 г.	Цена единицы в тек. ценах в (мес., квартал) 200__ г	Всего поставлено на сумму в текущих ценах по сост. на ____ кв. 200__ г без НДС (тыс.руб)	Плановый индекс-дефлятор	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18



к Положению о тематическом планировании, отчетности...

**«Утверждаю»:**

Руководитель Генеральной организации (ОАО «Атомэнергoproект»)

« » » 201 г. ( )

**«Утверждаю»:**

Директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом»

«Дирекция строящейся Нововоронежской АЭС-2»

« » » 201 г.

Заместитель директора по капитальному строительству, начальник УКС филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Нововоронежской АЭС-2»

« » »201 г.

**Остаточная (хвостовая) ведомость потребности оборудования и ТМЦ для освоения**

остаточных объемов КВЛ на строительстве объектов по проекту «Нововоронежская АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2» по состоянию на 2010г.

(наименование стройки, пускового комплекса, очереди )

[illegible]

Согласовано: Технический директор Генподрядной организации

Главный бухгалтер Генподрядной организации

Начальник ЦТО Генполярной организации

Начальник СДО Генпотрядной организации

# Главный инженер Заказчика-застройщика

Исследования инженер-экономиста

начальник отдела технического надзора Закавказья-закавказья

руководитель ЛКС ОАО «Концерн Росэнергоатом»:

Уководитель ДЭФ ОАО «Концерн Росэнергоатом»:

руководитель ДИЗ ОАО «Концерн Росэнергоатом»:

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер генеральной проектной  
организации (ОАО "Атомэнергoproject")

" " 201 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Генерального директора - директор по капитальному  
строительству ОАО "Концерн Росэнергоатом"

" " 201 г.

Принят к исполнению

Главный инженер проекта генеральной проектной  
организации (ОАО "Атомэнергoproject")

" " 201 г.

Директор филиала ОАО "Концерн Росэнергоатом"  
"Дирекция строящейся Нововоронежской АЭС-2"

" " 201 г.

Отчет

выполнения проектно-изыскательской документации за 2010 г. по сооружению объектов по проекту "Нововоронежская АЭС-2 с  
энергоблоками №1 и №2"

тыс.руб., без НДС

№ п/п	№ и дата договора	Наименование проектных работ (раздела и темы проектных работ), объекта строительства внутрипроектного титুলного списка (ВПТС)	Сметная стоимость ПИР по гл.12,смете и договору		Выполнено ПИР по гл.12 и смете с начала проектирования на 31.12.200 г.		Сроки выполнения работ по календарному плану договора		Выполнено ПИР по гл.12 и смете с начала года на 01 ____200 г.		Ожидаемый остаток сметной стоимости ПИР по гл.12 с учетом выплат за ____ кв 200 г. по сост. на 01 ____20 г.		План освоения ПИР по гл.12 и смете на ____квартал 200 г.		Фактическое освоение сметной суммы ПИР за ____20 г.		Индекс-дефлятор на планируемый период	Наименование тематических и целевых задач, разделов, подлежащих выполнению	Полное название проектной организации- исполнителя
			цены 2000г.	текущие цены	цены 2000г.	текущие цены	цены 2000г.	текущие цены	цены 2000г.	текущие цены	цены 2000г.	текущие цены							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1																			
2																			
3																			
Всего:																			

Составители:

Начальник ПТО ОАО "Атомэнергoproject" \_\_\_\_\_

Согласовано:

Главный инженер УКС

Начальник ПТО УКС

Начальник ОУП УКС

Согласовано:

Руководитель ДКС концерна "Росэнергоатом" \_\_\_\_\_

Руководитель ДЭФО концерна "Росэнергоатом" \_\_\_\_\_

Руководитель ДИЗ концерна "Росэнергоатом" \_\_\_\_\_



Приложение № 9

к Положению о тематическом планировании, отчетности...

"Утверждаю"

Руководитель генподрядной организации (ОАО "Атомэнергoproект")  
по пусконаладочным работам

\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_" 201\_\_\_\_ г. (И.О. Фамилия)

"Утверждаю"

Заместитель Генерального директора - директор по  
капитальному строительству  
ОАО "Концерна Росэнергоатом"

\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_" 201\_\_\_\_ г.

Директор

филиала ОАО "Концерна Росэнергоатом" "Дирекция строящейся Нововоронежской АЭС-2"

\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_" 201\_\_\_\_ г.

Отчет

ОАО "Атомэнергoproект"

(исполнительная организация Генерального подрядчика)

по выполнению пуско-наладочных работ по строительству объектов по проекту "Нововоронежская АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2"  
за \_\_\_\_\_ квартал 2010 г.

согласно договору от \_\_\_\_\_ 200\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ к \_\_\_\_\_

№№ объектных и локальных смет	Наименование объектных, локальных смет, и объектов внутрипостроечного титульного списка	Вид ГИР ("входную", "под нагрузкой")	Сметная стоимость в базисной цене _____ г. в текущих ценах без НДС		План-задание по освоению капитальных вложений по сметной стоимости в базисной цене _____ г. в текущих ценах без НДС		Фактическое исполнение квартального задания в базисной цене _____ г. в текущих ценах без НДС		тыс.руб.
			ц.2000 г	тек. цены	ц.2000 г	тек. цены	ц.2000 г	тек. цены	
1	2	3	4	5	6	6			

Отчет составил:

(Подпись)

(И.О.)
